




Ortsdurchfahrt Tutzing Anliegerversammlung Bauabschnitt Mitte

01 | Rückblick




01 | Rückblick | Bauabschnitte Nord und Süd

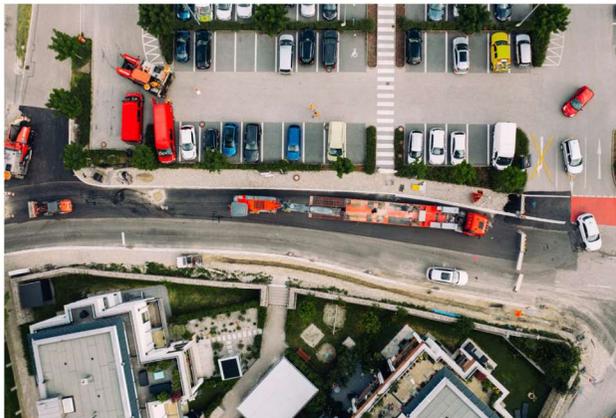


02 | Bisheriges Bauablaufkonzept




02 | Bisheriges Bauablaufkonzept

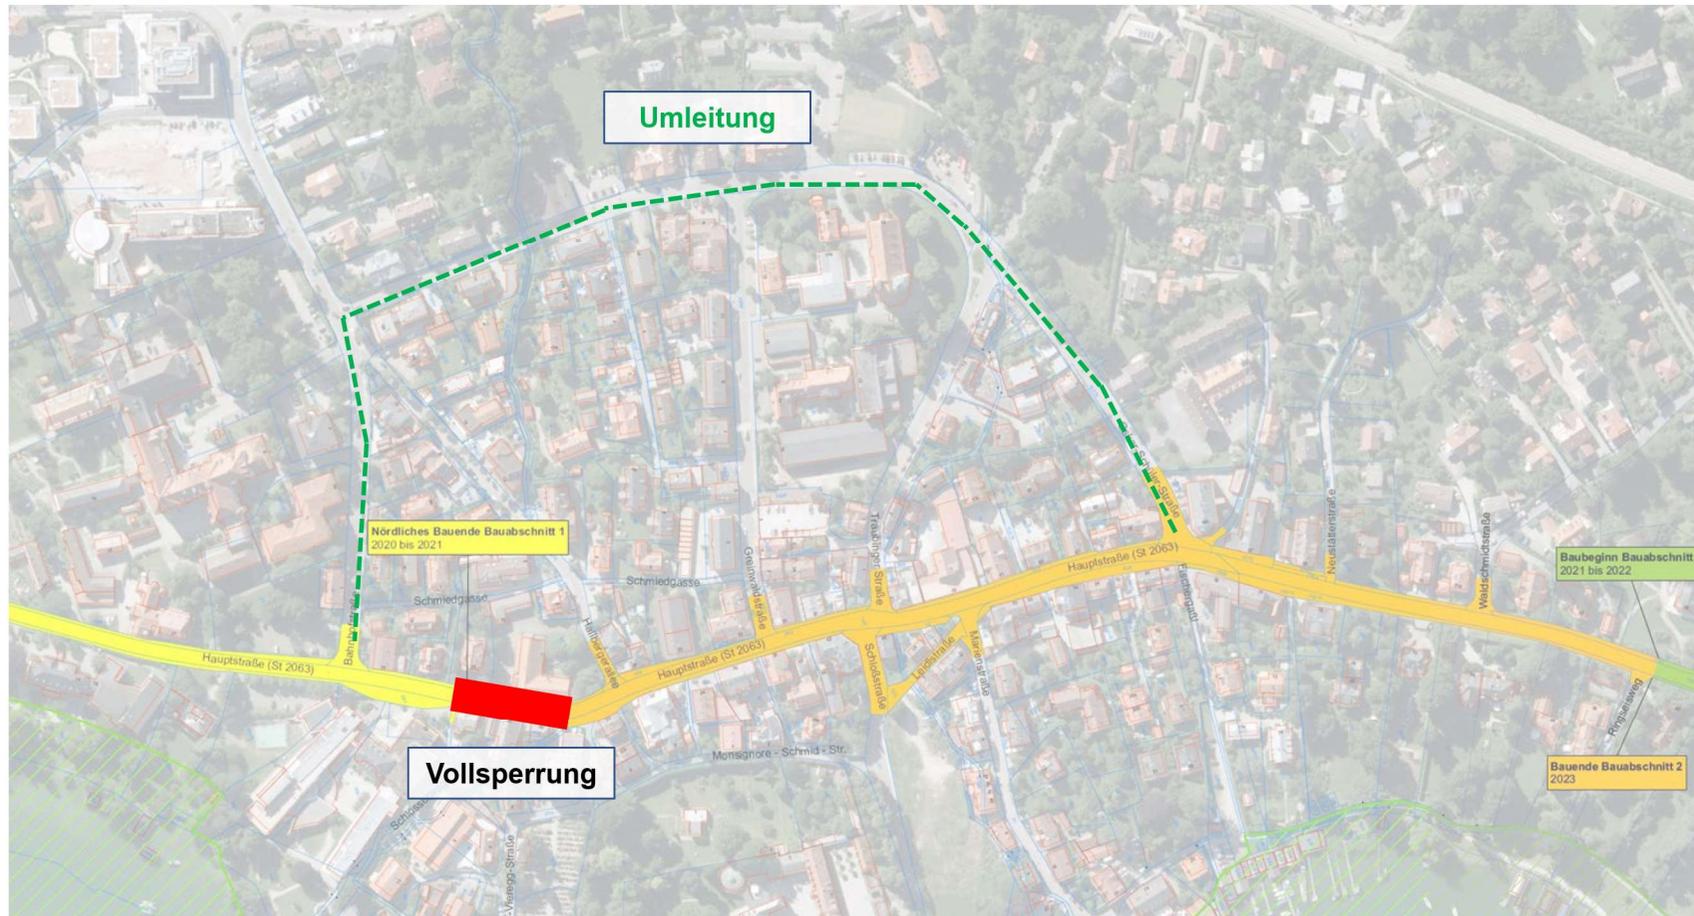

02 | Bisheriges Bauablaufkonzept

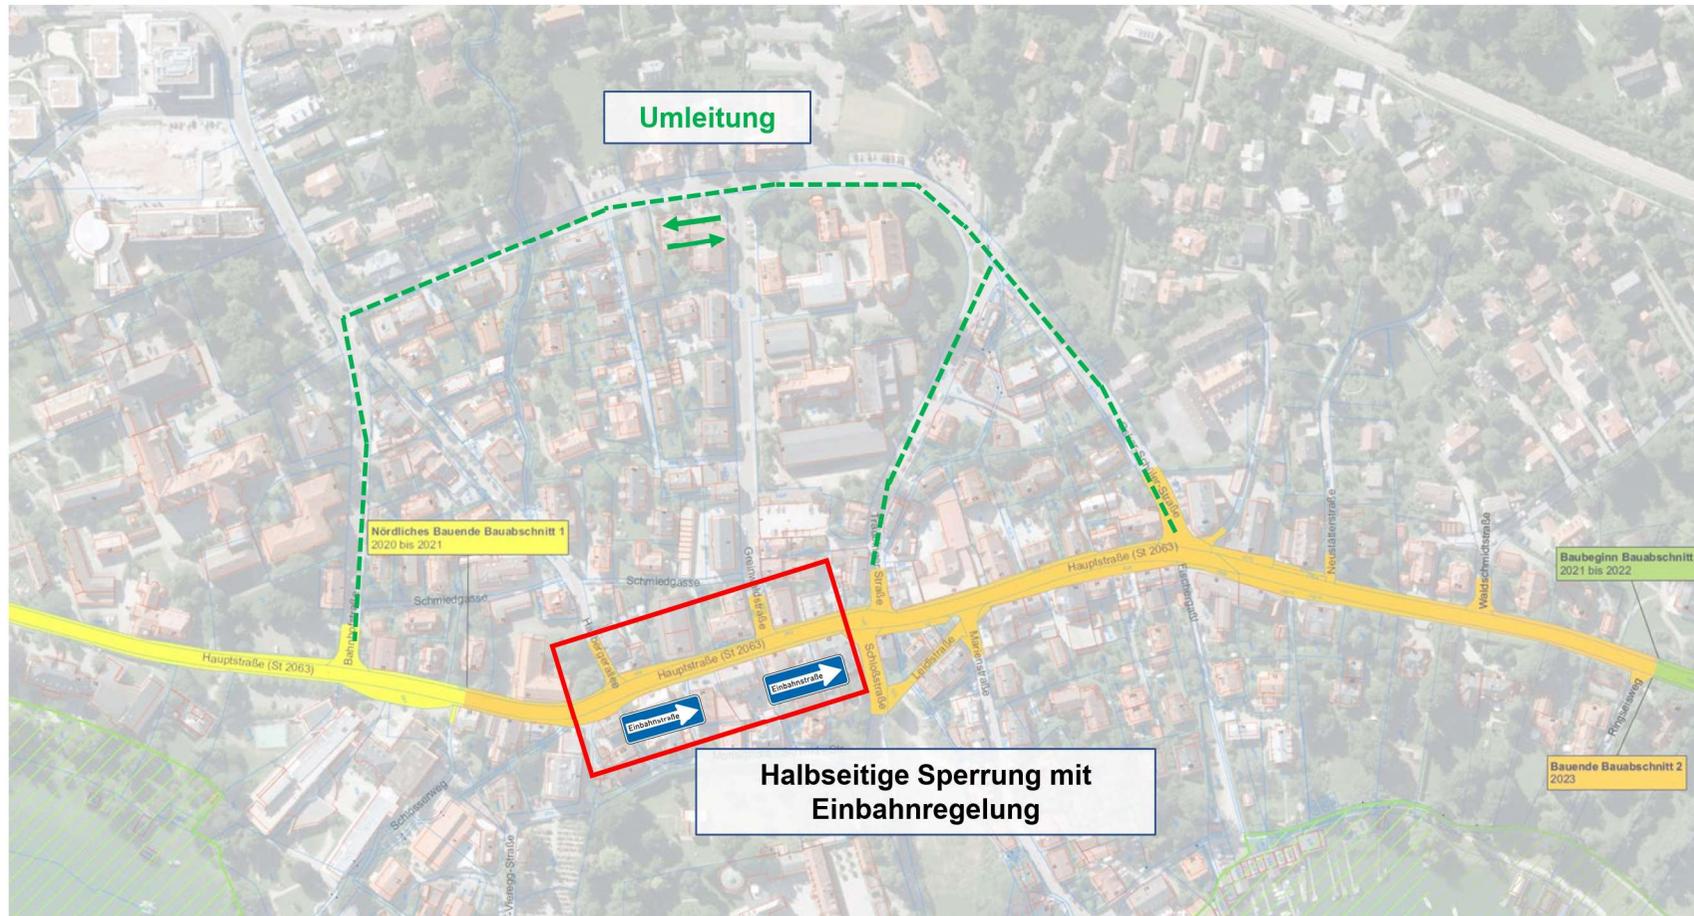

02 | Bisheriges Bauablaufkonzept

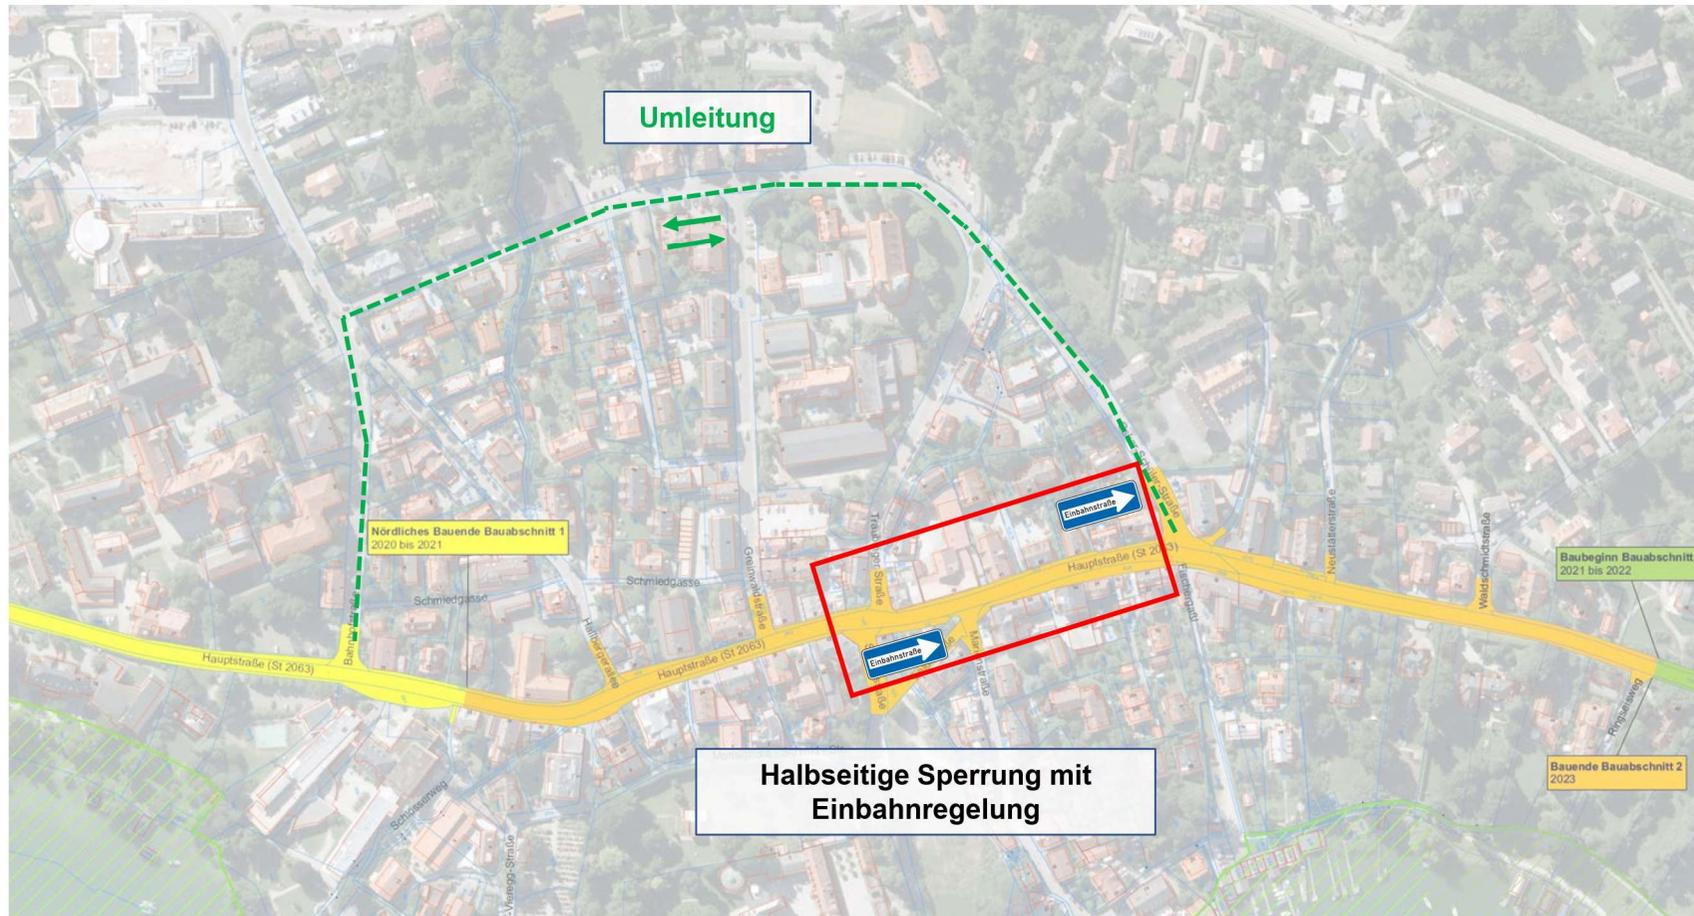

03 | Bauablauf 2024



03 | Bauablauf 2024 | Bauumfang

Gemeinde Tutzing	→	Erneuerung der Gehwege und Parkbuchten Erneuerung Einmündungsbereiche Nebenstraßen Umgestaltung „ Marienplatz “ Erneuerung Trinkwasserhauptleitung Teilerneuerung Trinkwasserhausanschlussleitungen Herstellung Leerrohrnetz für Glasfaser Erneuerung Bachverrohrungen (z.B. Wolfgrubengraben DN 1000)
Staatliches Bauamt	→	Erneuerung Fahrbahn Erneuerung Lichtsignalanlagen Erneuerung Straßenentwässerungseinrichtungen
Bayernwerk	→	Erneuerung Erdkabel (Ortsnetz und Straßenbeleuchtung)
Telekom	→	Erneuerung Erdkabel

03 | Bauablauf 2024 | “Vollsperrung“

Was ist bedeutet Vollsperrung?

Baustellenbereich für Fahrzeuge aller Art gesperrt.

Die Zufahrt für Anlieger zu den Grundstücken ist jederzeit gegeben.
Eine Durchfahrt durch den Baustellenbereich ist jedoch nicht möglich.

Durchwegung für Fußgänger in einem abgeschrankten Bereich
jederzeit möglich.

Zuwegung zu den Geschäften und Hauseingängen in einem
abgeschrankten Bereich jederzeit möglich.


Lokale Sperrungen werden mit ausreichend Vorlauf mit den
Eigentümern / Mietern vor Ort geklärt.



03 | Bauablauf 2024 | Bauabschnitte



03 | Bauablauf 2024 | Überblick Verkehrsführung

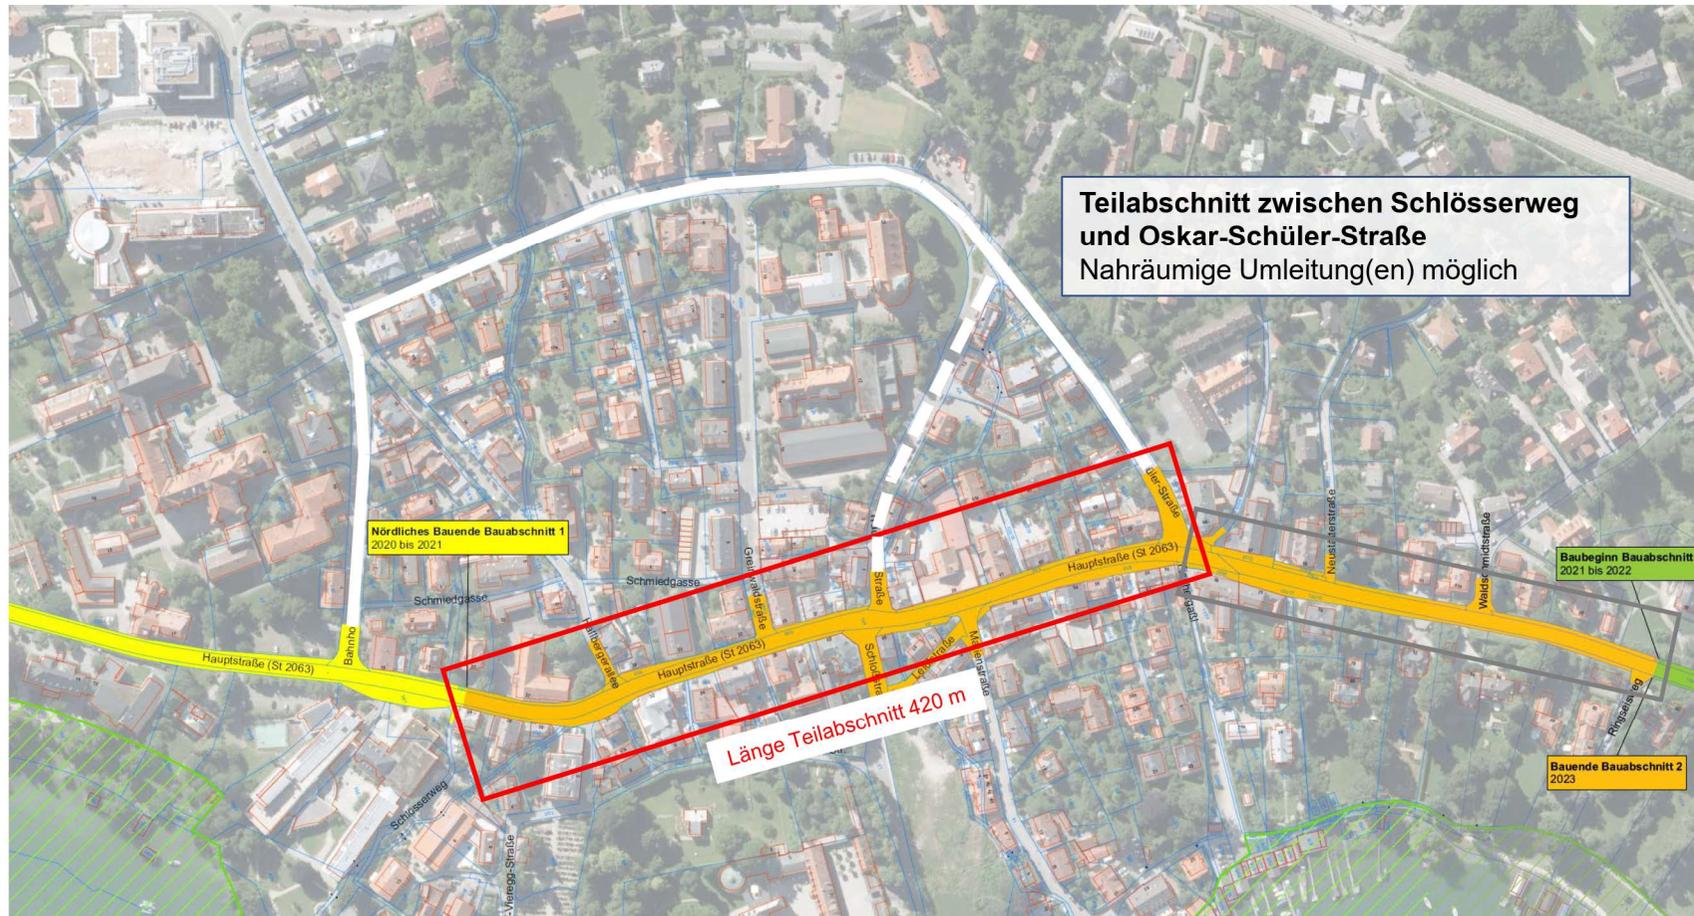

03 | Bauablauf 2024 | Bauabschnitt 1 - Detailansicht



Bauabschnitt 1

Wo?

Zwischen Schlösserweg und Hallbergallee

Wann?

Von: 13.05.2024

Bis: 21.06.2024

Dauer: 6 Wochen


Besonderheiten?

Abschnitt Bahnhofstraße bis Schlösserweg in den Pfingstferien


Einmündung Hallbergallee erst 2025

Erneuerung Bachverrohrung

03 | Bauablauf 2024 | Bauabschnitt 2 - Übersicht

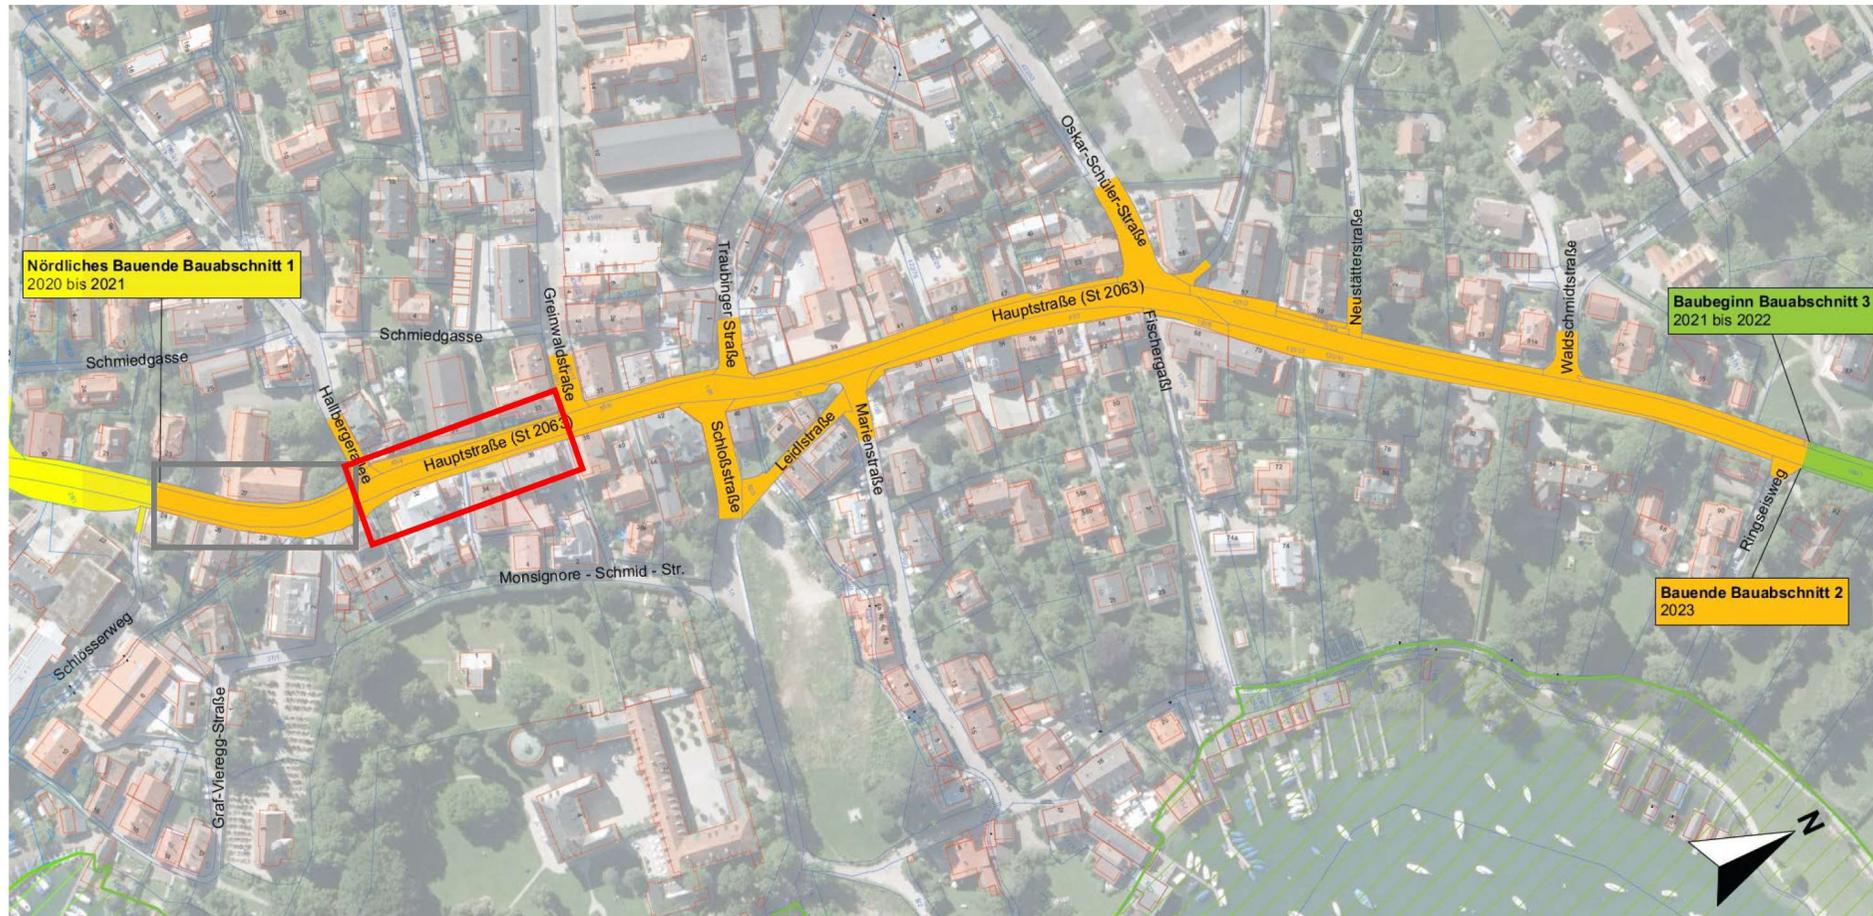

03 | Bauablauf 2024 | Bauabschnitt 2 - Detailansicht

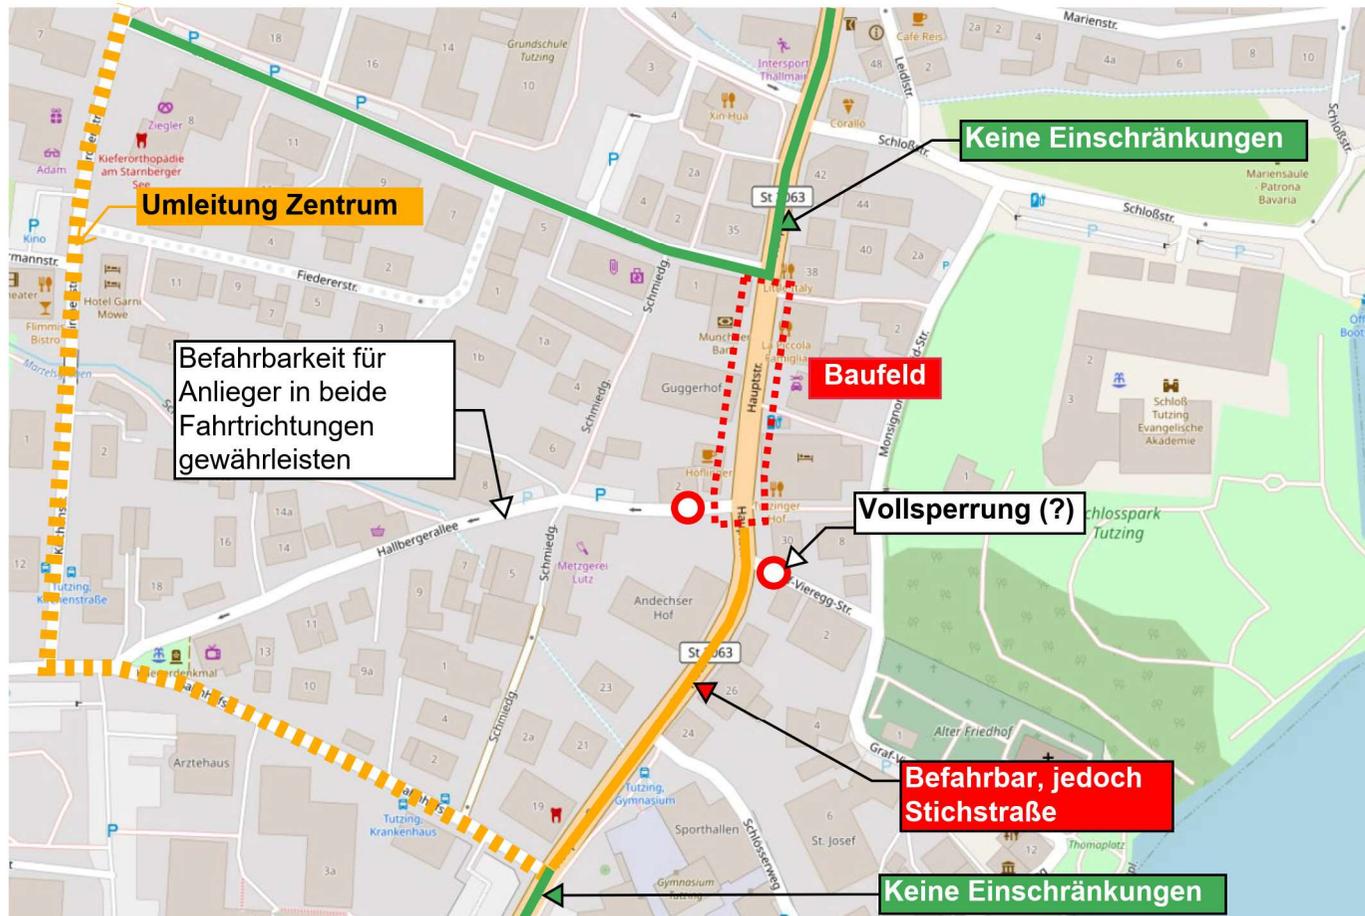

Bauabschnitt 2

Wo?

Zwischen Hallbergerallee und Greinwaldstraße

Wann?

Von: 24.06.2024


Bis: 02.08.2024

Dauer: 6 Wochen

Besonderheiten?

Einmündung Greinwaldstraße erst 2025

03 | Bauablauf 2024 | Bauabschnitt 3 - Übersicht

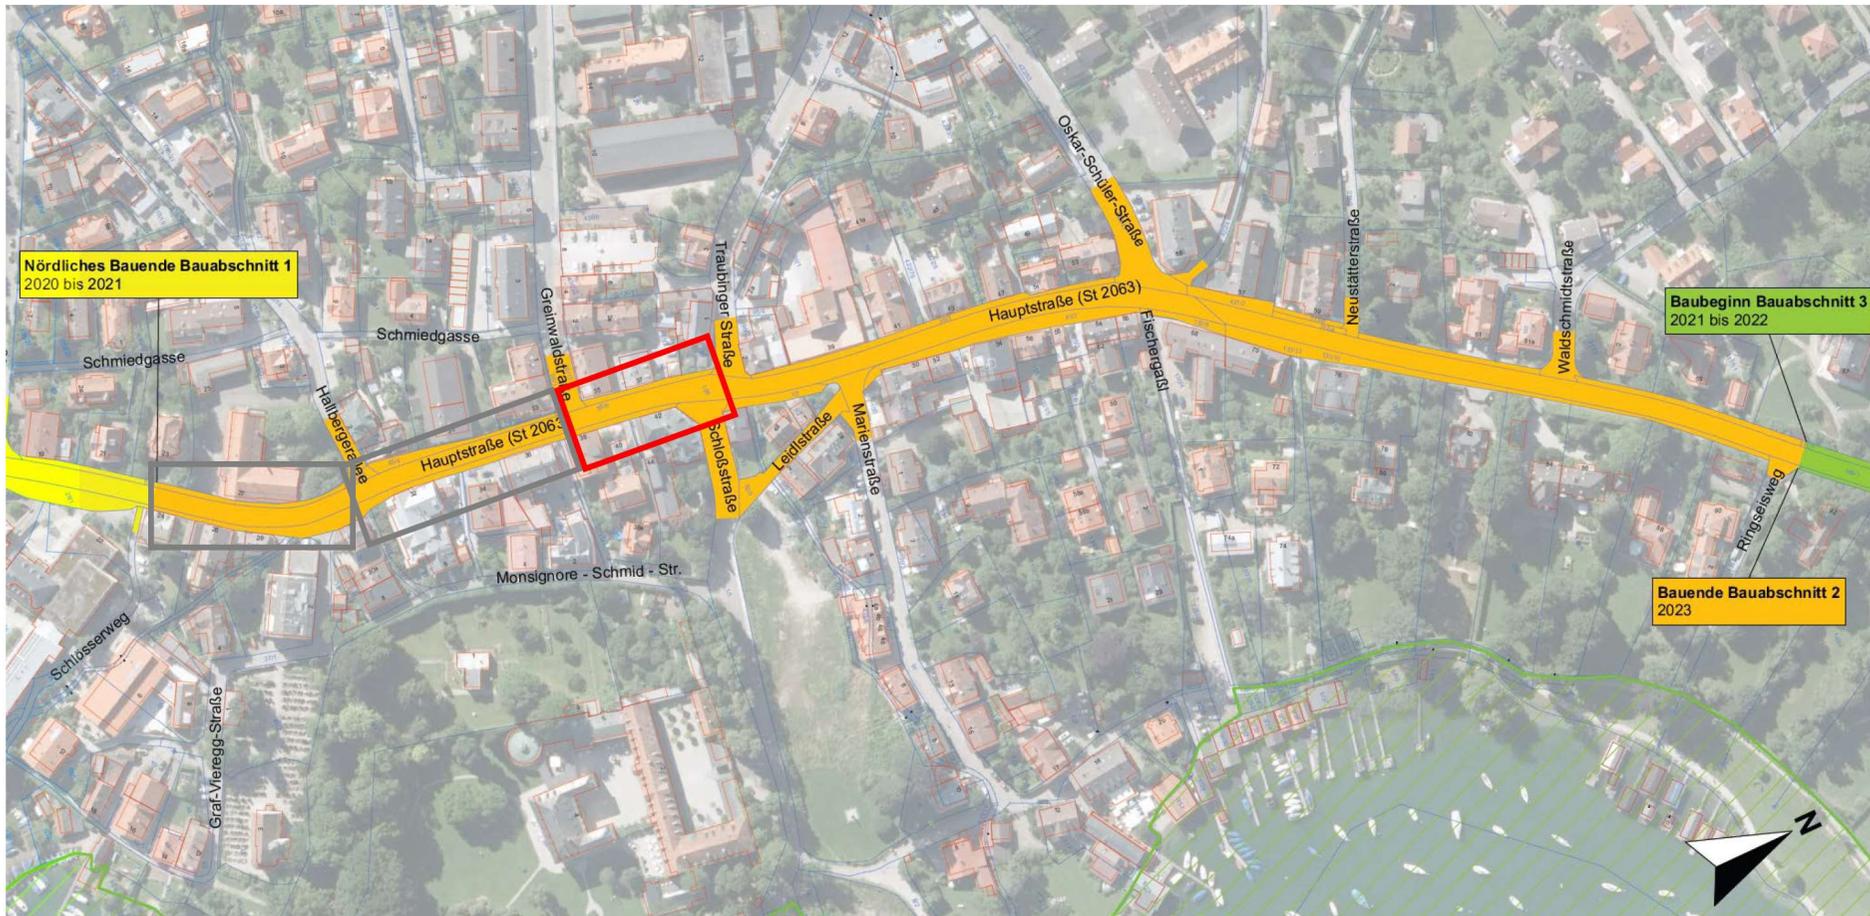

03 | Bauablauf 2024 | Bauabschnitt 3 - Detailansicht



Bauabschnitt 3

Wo?

Zwischen Greinwaldstraße und Schloßstraße

Wann?

Von: 05.08.2024

Bis: 30.08.2024


Dauer: 4 Wochen

Besonderheiten?

Einmündungsbereich und Straßenraum Schloßstraße erst 2025

Ein- und Ausfahrt Schloßstraße in Bauphase 3 möglich

03 | Bauablauf 2024 | Bauabschnitt 4 - Übersicht

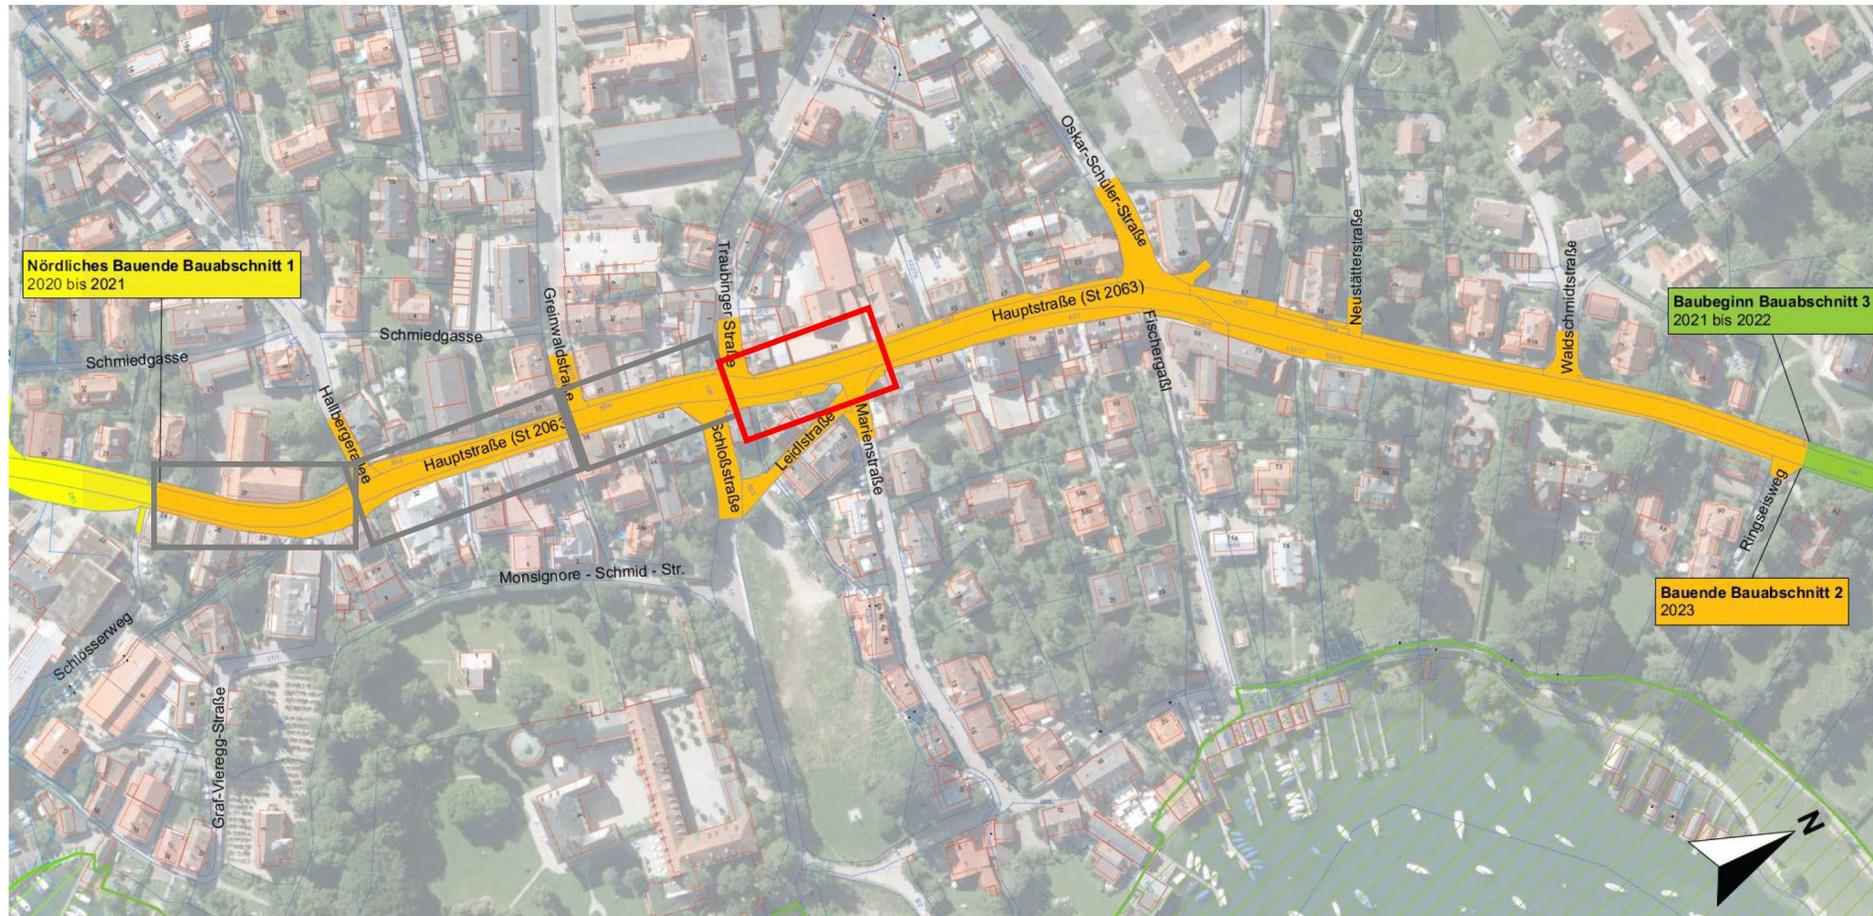

03 | Bauablauf 2024 | Bauabschnitt 4 - Detailansicht



Bauabschnitt 4

Wo?

Zwischen Schloßstraße und Marienstraße

Wann?

Von: 02.09.2024

Bis: 11.10.2024

Dauer: 6 Wochen

Besonderheiten?

Einmündungsbereich und Straßenraum Schloßstraße erst 2025

Einmündung Traubinger Straße gesperrt

Ein- und Ausfahrt Schloßstraße in Bauphase 3 möglich

Herstellung Bachverrohrung

03 | Bauablauf 2024 | Bauabschnitt 4a - Detailansicht


Bauabschnitt 4a

Wo?

Zwischen Schloßstraße und Marienstraße



03 | Bauablauf 2024 | Bauabschnitt 4b - Detailansicht

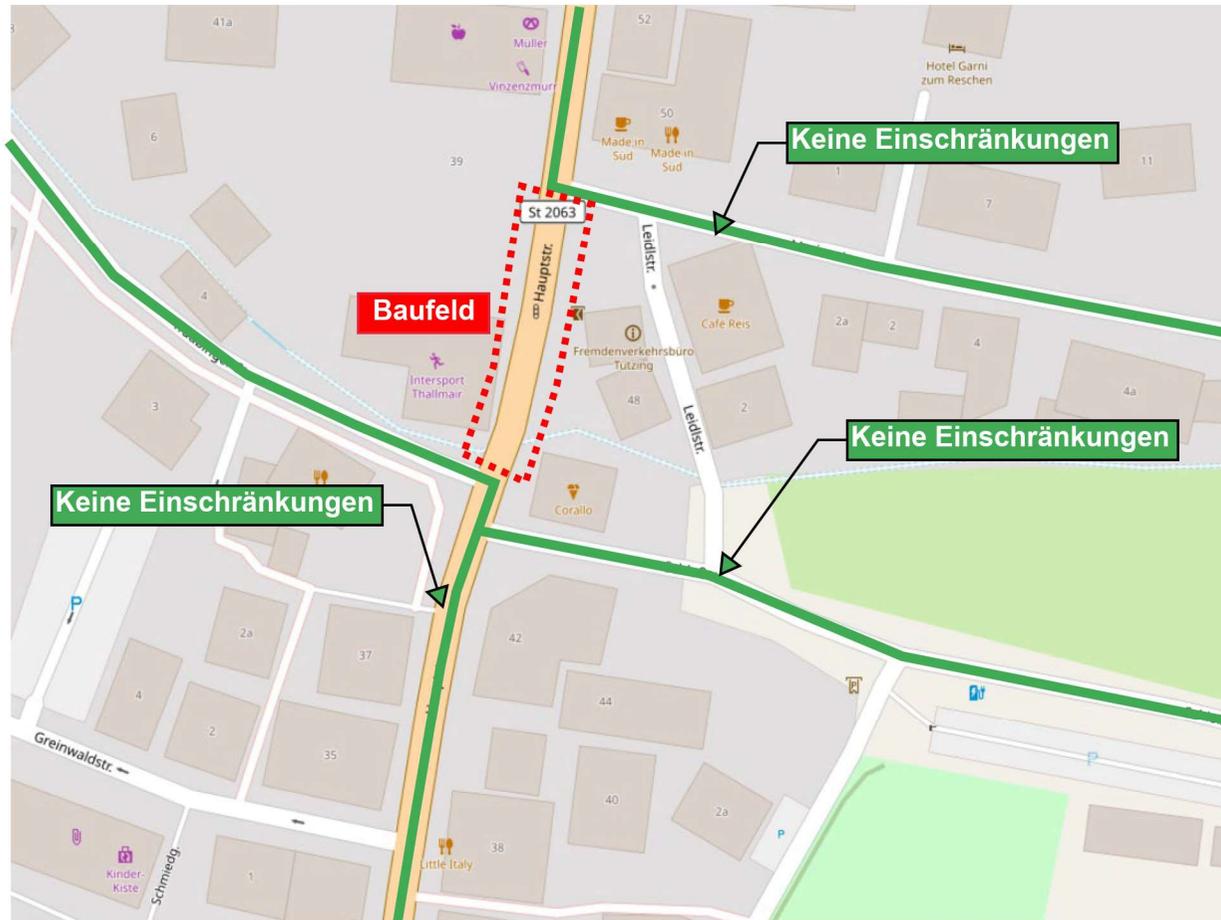


Bauabschnitt 4b


Wo?

Zwischen Schloßstraße und Marienstraße

03 | Bauablauf 2024 | Bauabschnitt 5 - Übersicht

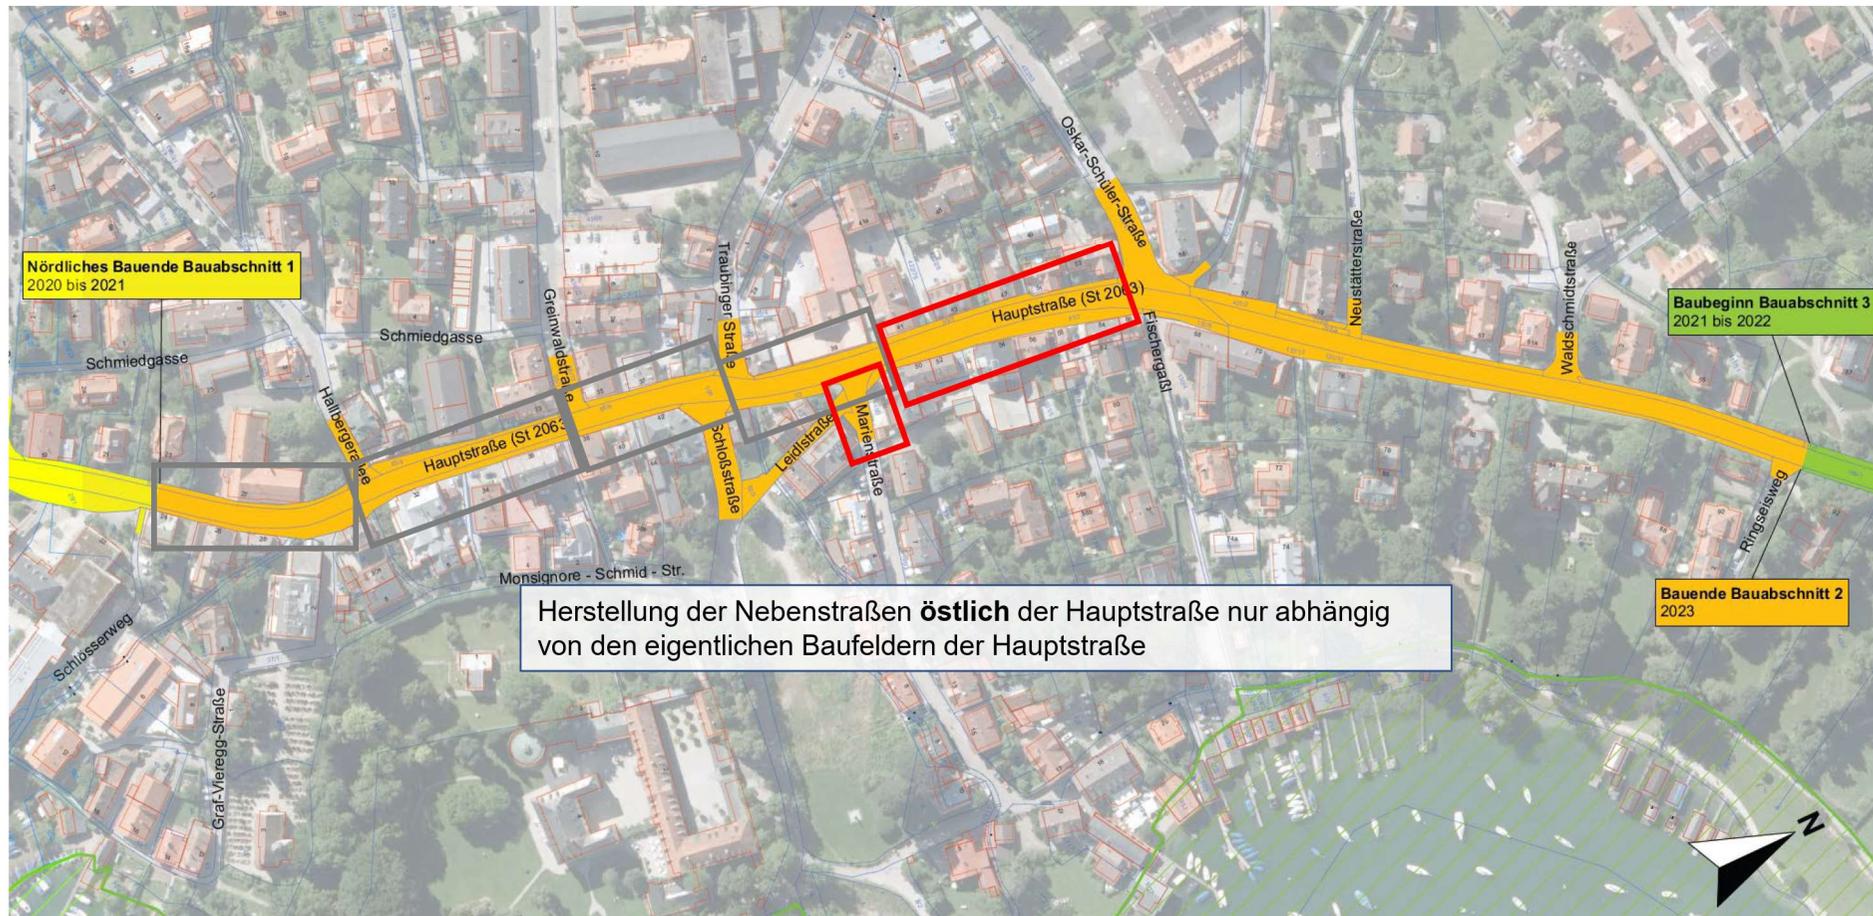

03 | Bauablauf | Bauabschnitt 5 (2024) - Detailansicht

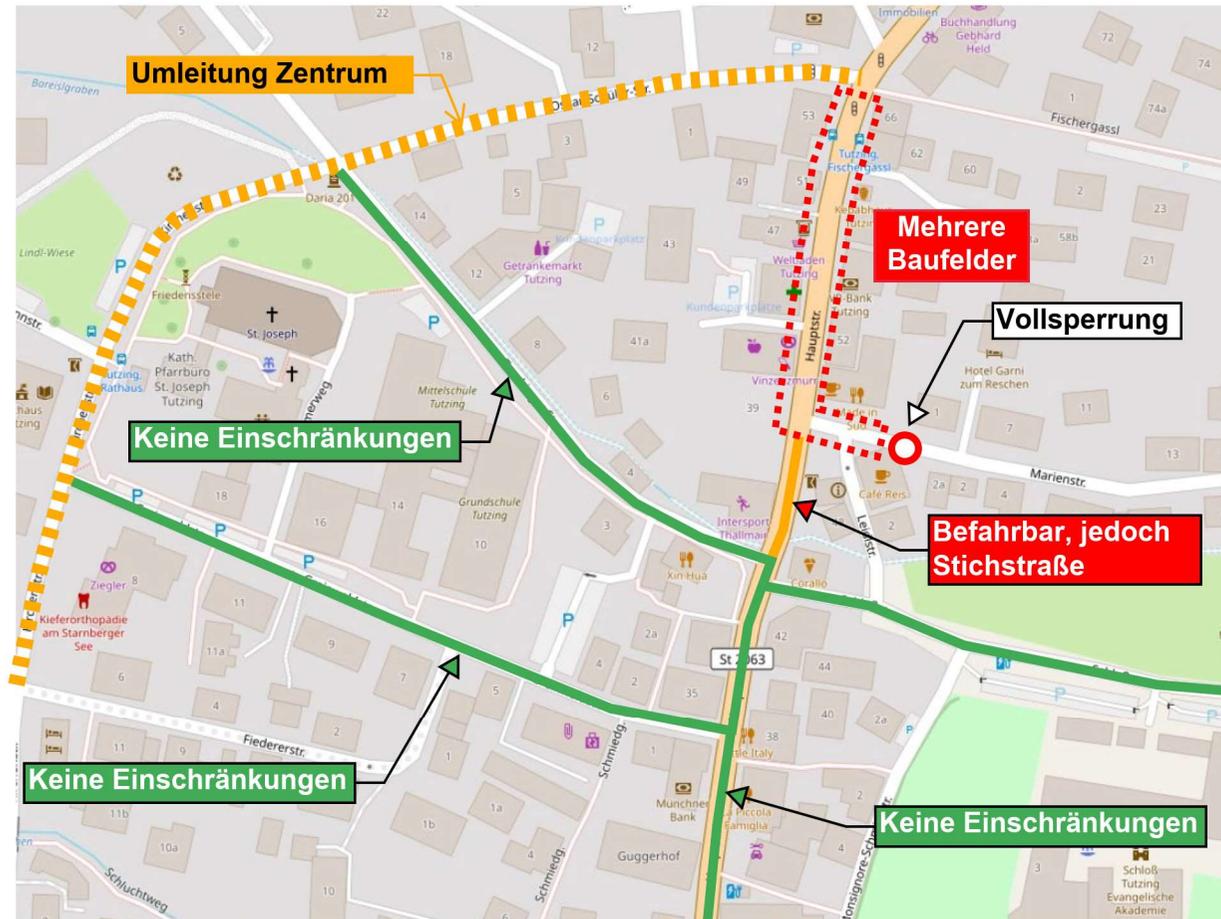

Bauabschnitt 5

Wo?

Zwischen Marienstraße und Oskar-Schüler-Straße

Marienstraße

Wann?

Von: 14.10.2024

Bis: 29.11.2024

Dauer: 7 Wochen

Besonderheiten?


Abschnittsweise Baufelder

Bauende 2024

04 | Bauablauf 2025



04 | Bauablauf 2025 | Bauabschnitt 6 - Übersicht

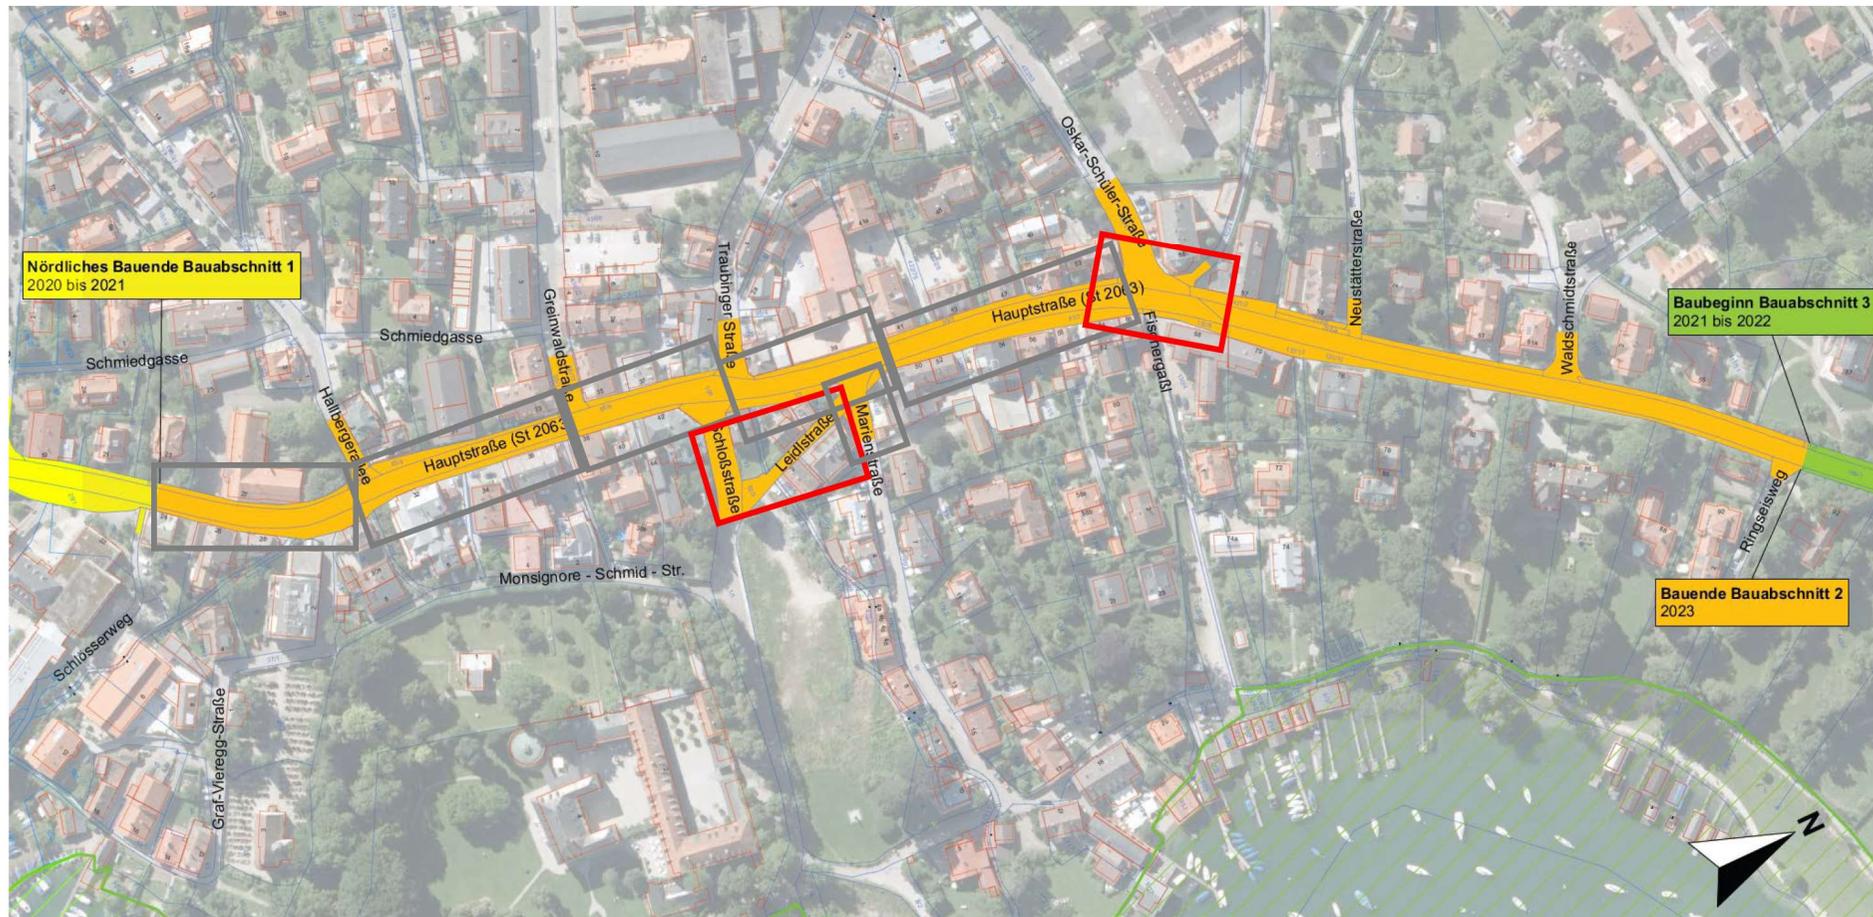

04 | Bauablauf 2025 | Bauabschnitt 6a - Detailansicht



Bauabschnitt 6a

Wo?

Schloßstraße und Leidlstraße


Wann?

Von: 17.03.2025

Bis: 02.05.2025

Dauer: 8 Wochen

04 | Bauablauf 2025 | Bauabschnitt 6b - Detailansicht

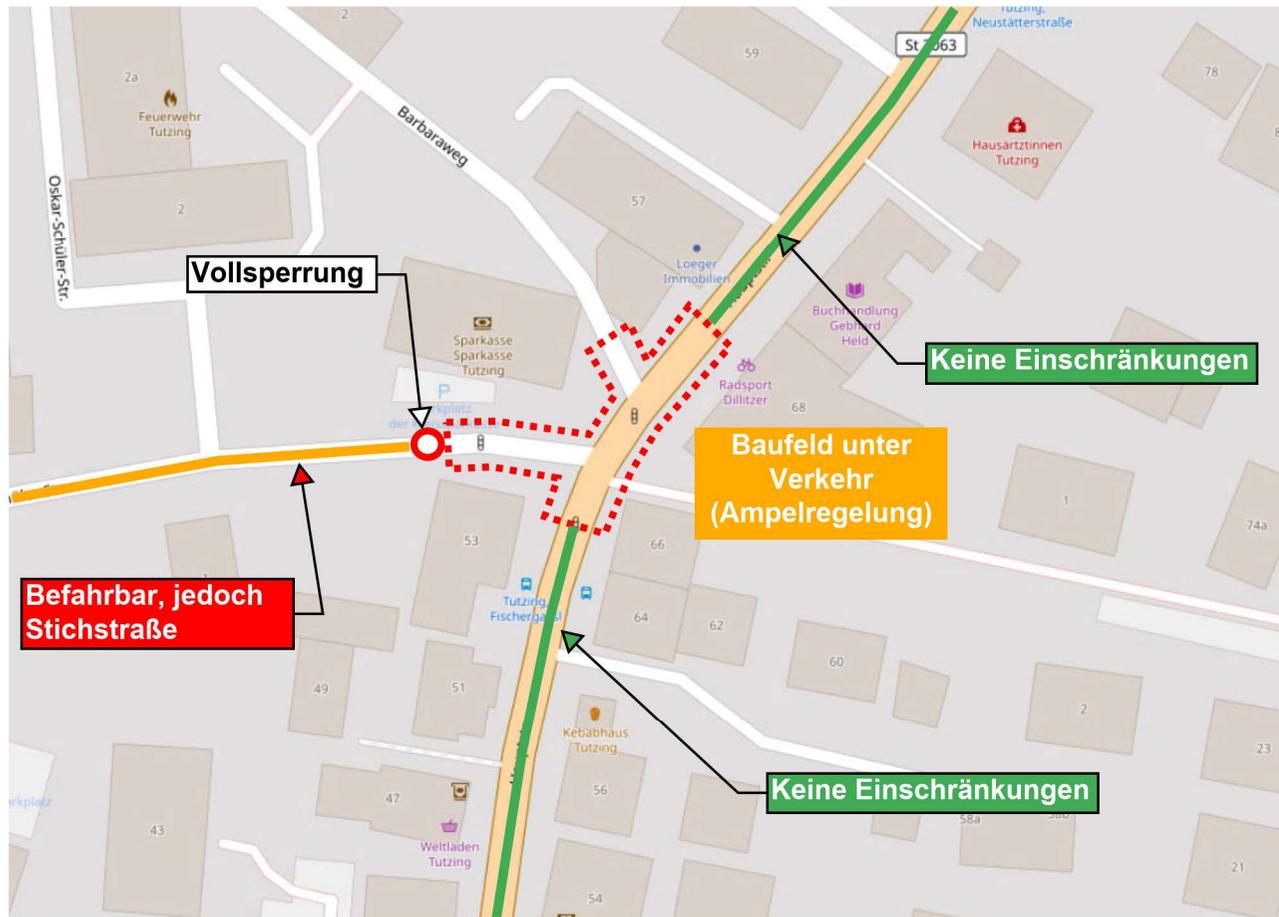

Bauabschnitt 6b

Wo?

Kreuzungsbereich Hauptstraße / Oskar-Schüler-Straße

Wann?

Von: 17.03.2025


Bis: 02.05.2025

Dauer: 8 Wochen

Besonderheiten?

Abschnittsweise Baufelder unter Ampelregelung

04 | Bauablauf 2025 | Bauabschnitt 7 und 8 - Übersicht

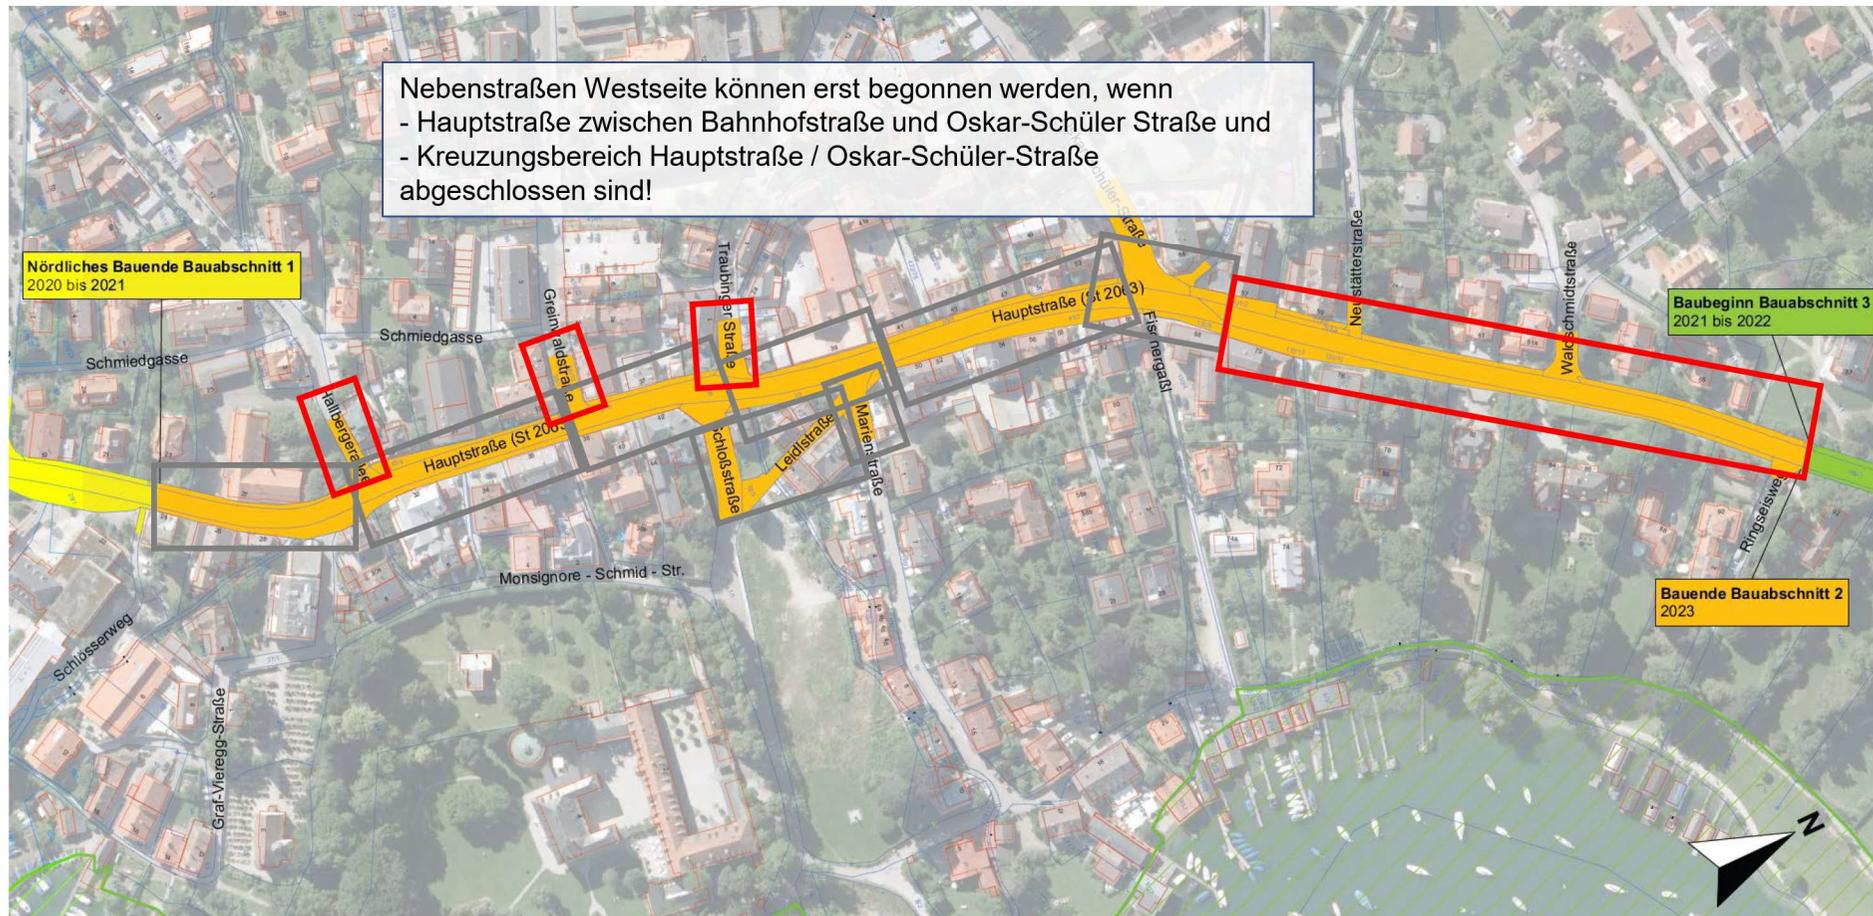

04 | Bauablauf 2025 | Bauabschnitt 7 - Detailansicht



Bauabschnitt 7

Wo?

Hauptstraße zwischen Oskar-Schüler-Straße und Ringseisweg

Wann?

Von: 05.05.2025

Bis: 29.08.2025


Dauer: 17 Wochen

Besonderheiten?

Abschnittsweise Baufelder unter Ampelregelung mit einer Länge von 50 bis 75 m.

Wolfsgrubengraben in Nachtarbeit

04 | Bauablauf 2025 | Bauabschnitt 8a - Detailansicht

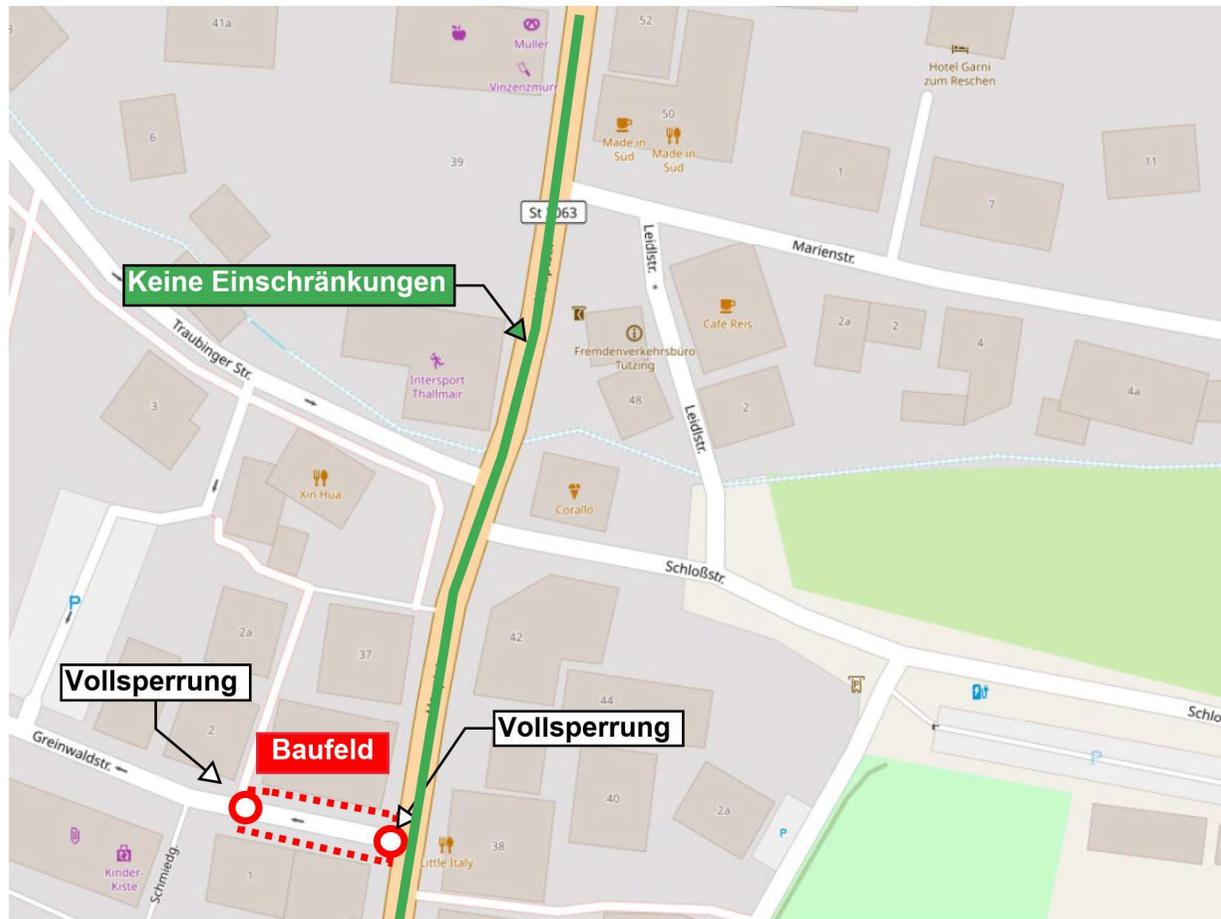

Bauabschnitt 8a

Wo?

Greinwaldstraße

Wann?

Von: 05.05.2025


Bis: 23.05.2025

Dauer: 3 Wochen

Besonderheiten?

keine

04 | Bauablauf 2025 | Bauabschnitt 8b - Detailansicht

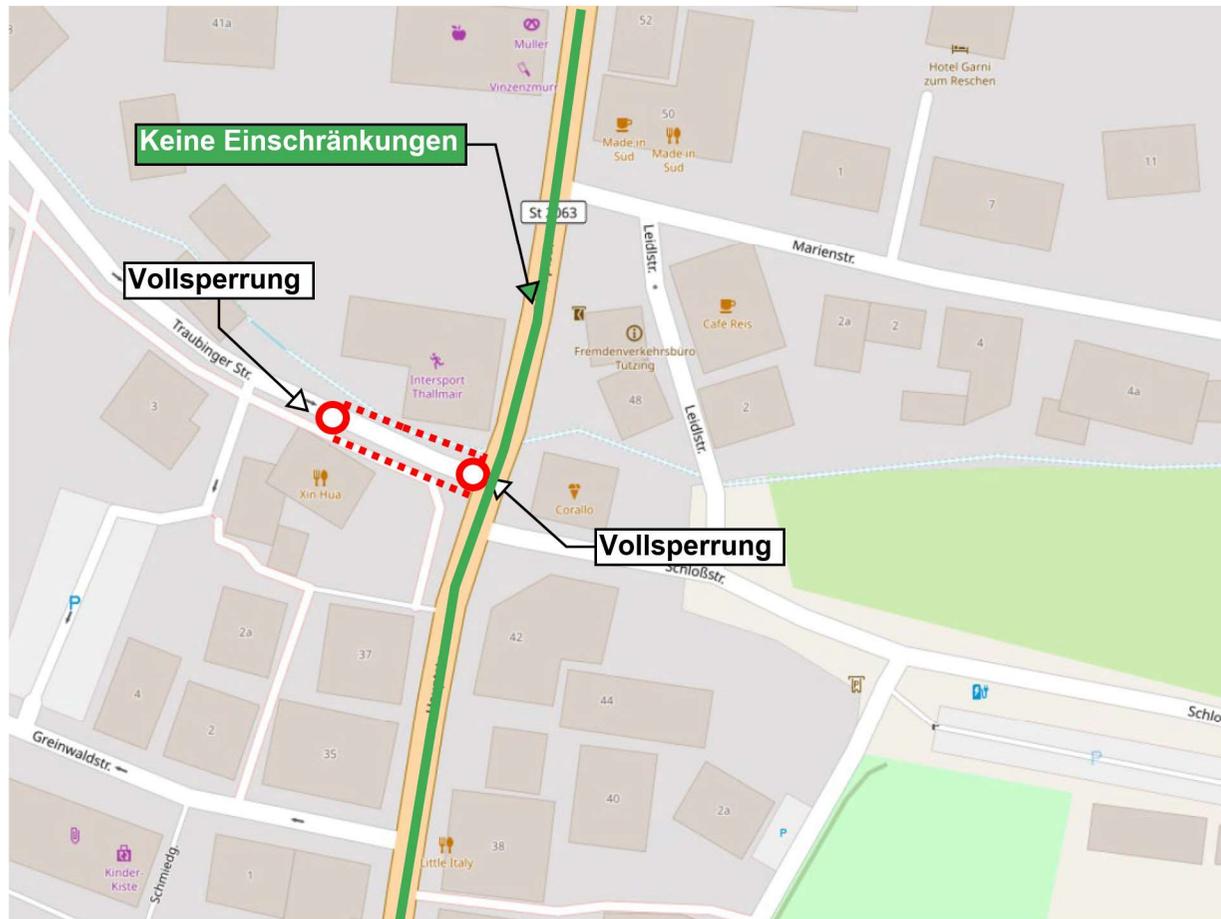

Bauabschnitt 8b

Wo?

Traubinger Straße und Hallbergerallee

Wann?

Von: 05.05.2025

Bis: 13.06.2025

Dauer: 3 Wochen

Besonderheiten?

keine

05 | Zusammenfassung



05 | Zusammenfassung

2024 Mai bis November 2024:

- Hauptstraße zwischen Bahnhofstraße und Oskar-Schüler-Straße
- Marienstraße

2025 März bis Juni 2025:

- Kreuzungsbereich Hauptstraße / Oskar-Schüler-Straße
- Leidl- und Schlosstraße
- Greinwaldstraße
- Hallbergerallee
- Traubinger Straße

→ Juni 2025 Zentrumsbereich zwischen Bahnhofstraße und Oskar-Schüler-Straße fertiggestellt.

Mai bis August 2025:

- Hauptstraße zwischen Oskar-Schüler-Straße und Ringseisweg

September 2025:

Restleistungen
